


Планирование и риски

Олег

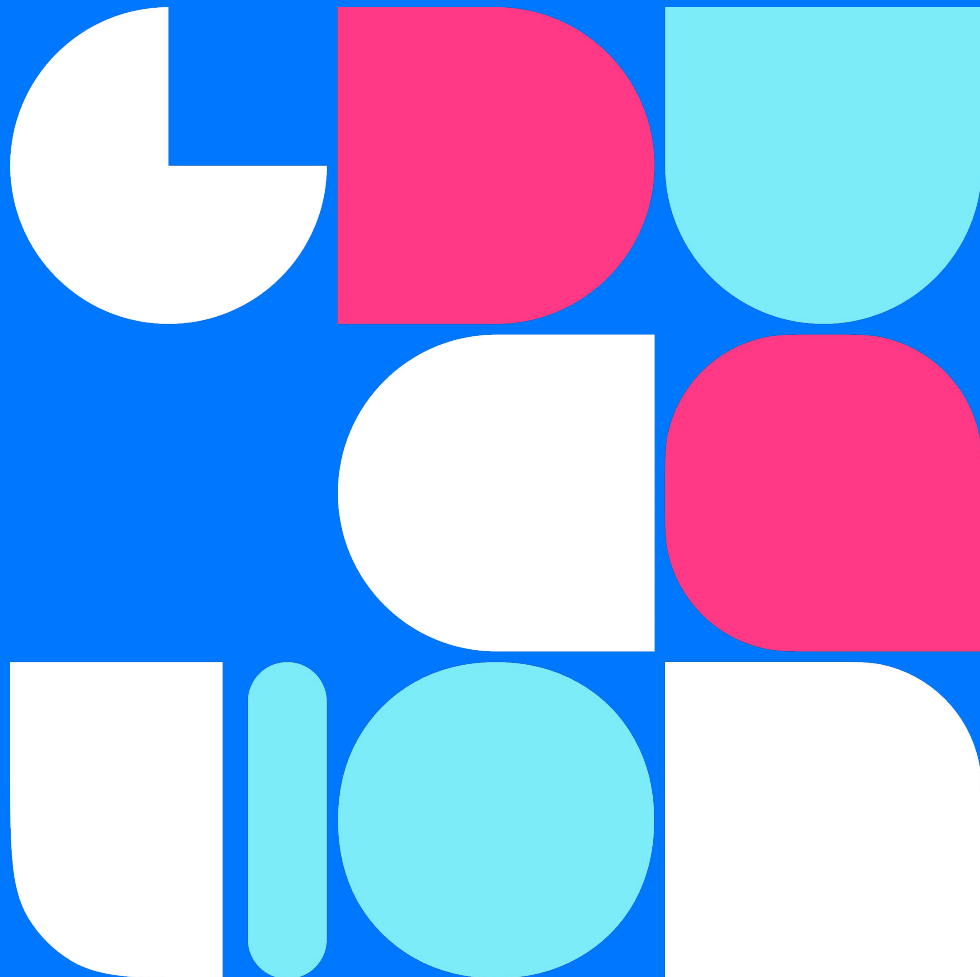

Зачем это все?

Не так страшны первые 80% работы,
как оставшиеся... 80%

Зачем это все?


1. Оценить время выполнения \трудоzатраты\уровень команды\финансы на инфраструктуру
2. Определится с технологиями
3. Составить четкое техническое задание (расписать функциональные и нефункциональные требования)
4. С целью постановки реалистичных целей
5. Остановиться на выборе оптимального фреймворка разработки
6. Не забыть про безопасность и защиту данных
7. Оценить размер данных для хранения
8. Для анализа различных сценариев, которые хочет заказчик

Что такое риски

Риски

Риски – это потенциальные угрозы или проблемы, которые могут возникнуть в процессе выполнения проекта и повлиять на его результаты

Цель управления рисками – своевременно идентифицировать, оценить и принять меры для минимизации или устранения этих рисков

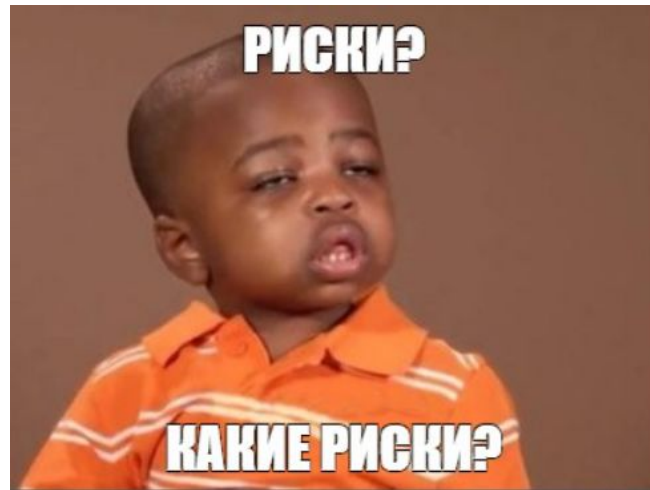

Как управлять рисками

Управление рисками

Идентификация рисков

- мозговой штурм;
- анализ исторических данных;
- интервью с экспертами.


Анализ (оценка) рисков

Оценить их вероятность и возможное влияние на проект

Управление рисками (в узком смысле)

разработка стратегий реагирования на риски:
для каждого риска, который требует вашего внимания,
нужно разработать стратегию реагирования

**Manager: Did you
finish your task?**

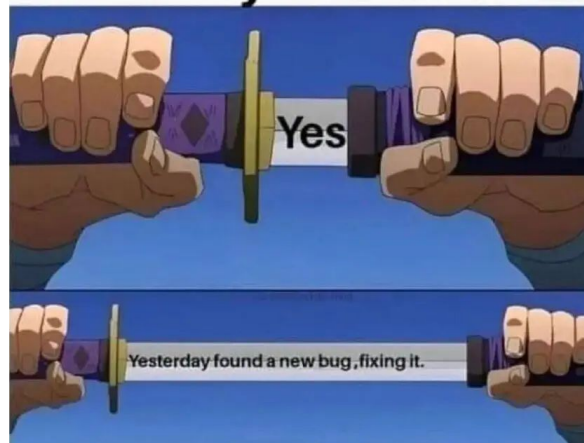

Управление рисками (в узком смысле)

Принять риск: иногда риски являются неизбежными или принятие их имеет существенное меньший вред, чем стоимость любых действий по активному реагированию. Эту стратегию мы выбираем для рисков с низким влиянием.

Смягчить риск: если вероятность риска средняя или высокая, и влияние среднее или высокое, то необходимо попробовать смягчить риск, например, путем проведения дополнительных тестов или создания ресурсной подушки (подготовленной опции для оперативного увеличения ресурсного бюджета проекта).

Предотвратить риск: для выявленных на ранних этапах (инициация, планирование) рисков среднего и высокого влияния, если это представляется возможным, стоит произвести профилактику — предпринять меры для предотвращения возникновения таких рисков, и, следовательно, снижения их вероятности. Это может включать, к примеру, дополнительное обучение персонала, внедрение резервных планов, усиление контроля качества и др.

Управление рисками (в узком смысле)

Передать риск: в некоторых случаях, можно передать риск на другую сторону, например, подрядчика или на страховую компанию. Это может быть особенно полезно, если у вас недостаточно ресурсов или опыта для самостоятельного управления данным риском.

Переделать план проекта: это самый критичный случай — когда возникает риск, у которого высокое влияние на проект, часто приходится прибегнуть к радикальному шагу возврата на этап планирования. В этом случае мы полностью пересобираем план проекта, учитывая изменившиеся обстоятельства.

Не рассматривать

Управление рисками

Влияние	Вероятность		
	Низкая	Средняя	Высокая
Низкое	Не рассматривать	Принять	Принять
Среднее	Не рассматривать.	Смягчить Предотвратить	Смягчить Предотвратить
Высокое	Передать (по возможности)	Смягчить Предотвратить Переделать план	Смягчить Предотвратить Переделать план

Классификация рисков

Внутренние риски: Эти риски возникают из-за факторов, находящихся внутри организации или проекта

- *Связанные с управлением проектом*
- *Технические риски*
- *Организационные риски*

Внешние риски: Возникают из-за факторов, находящихся вне организации или проекта

- *Регуляторные*
- *Рыночные*
- *Чрезвычайные*

Внутренние риски управления проекта

Внутренние риски управления проекта

Риск недостаточной квалификации персонала

Пример: если член команды проекта не имеет необходимых навыков или опыта для выполнения определенной задачи, это может привести к задержкам в проекте или низкому качеству результатов.

Реагирование: работа с этим риском может включать обучение сотрудников, привлечение дополнительных экспертов или перераспределение ресурсов внутри команды.

Внутренние риски управления проекта

Риск превышения бюджета

Пример: если проект тратит средства быстрее, чем планировалось, это может привести к недостатку финансовых ресурсов для завершения проекта.

Реагирование: чтобы справиться с этим риском, можно усилить контроль расходов, пересмотреть и оптимизировать бюджет, а также искать дополнительные источники финансирования.

Внутренние риски управления проекта

Риск изменения требований

Пример: изменение требований к проекту может возникнуть из-за неправильного понимания потребностей заказчика или изменения их приоритетов.

Реагирование: работа с этим риском может включать улучшение коммуникации с заказчиком, внедрение гибких методологий управления проектами и учет возможных изменений в планировании проекта.

Внутренние риски управления проекта

Scope creep (он же *kitchen sink syndrom*, синдром кухонной раковины) — риск увеличения объёма работы по проекту во время его выполнения, описывает ситуацию, когда в проект включаются все возможные функции, идеи и требования без должной оценки их важности, приоритетов и ресурсов, необходимых для их реализации. Это может привести к увеличению сложности проекта, растягиванию сроков, увеличению бюджета и, в конечном итоге, к провалу проекта.

Реагирование: Тут поможет работа с различными инструментами приоритизации требований и четкое описание ограничений и рамок проекта.

Внутренние риски управления проекта

Риск задержки в выполнении проекта — предполагает работу с планированием резервного времени и применением методов ускорения выполнения работ.

Риск недостаточного управления проектом. Если процессы управления проектом организованы неэффективно, это может привести к проблемам с координацией, контролем и мониторингом выполнения задач, что в свою очередь может вызвать задержки, превышение бюджета или низкое качество результатов.

Реагирование: работа с этим риском может включать улучшение процессов управления проектом, обучение команды применению лучших практик управления проектами, а также внедрение специализированных инструментов для управления проектами, использование стандартных протоколов и шаблонов документации.

Выводы

- Выбирайте планирование и уровень детализации в зависимости от цели
- Глубина и точность планирования зависит от срока
- Заранее описывайте риски и стратегии реагирования
- Разделяйте риски по степени влияния

Вопросы?



Что такое планирование?

Что такое планирование?

- **Когда и сколько:** Долгосрочное и краткосрочное планирование
- **Что и как:** Общее и детализированное планирование
- **Какими методами:** Гибкое или каскадное
- **На каком этапе:** Инициация, реализация или поддержка
- **Для кого:** Корпоративное, проектное или командное



Виды планирования

Долгосрочное планирование

- **Горизонт:** От 1 года и более.
- **Цель:** Определить стратегию развития проекта.
- **Что включает:**
 - Общая концепция проекта.
 - Архитектура и основные технологические решения.
 - Планирование крупных этапов и релизов.
- **Пример:** Стратегия цифровой трансформации компании на 3 года.

Среднесрочное планирование

- **Горизонт:** От нескольких месяцев до 1 года.
- **Цель:** Определить ключевые проекты и задачи на ближайшее время.
- **Что включает:**
 - Планы отдельных этапов разработки.
 - Контрольные точки и промежуточные результаты.
- **Пример:** Планы выпуска новых версий продукта в течение года.

Краткосрочное планирование

- **Горизонт:** От одного дня до нескольких недель.
- **Цель:** Организация повседневной работы.
- **Что включает:**
 - Планирование спринтов и ежедневных задач.
 - Распределение ресурсов на короткие периоды.
- **Пример:** План задач на спринт в Scrum на 2 недели.

Гант

- Срыв сроков - одна из ключевых проблем разработки
- Дедлайн - когда все должно быть готово
 - А не когда надо начинать работу
 - Понимание в момент дедлайна что не успеваем - это “черный лебедь”
- Гант позволяет увидеть проблемы со сроками в самом начале

Вопросы?



Практика



Практическое задание №6

Выявите 4-6 ключевых рисков для вашего проекта. Укажите их тип: внутренний или внешний. Оцените уровень рисков. Продумайте стратегию реагирования.

**Спасибо
за внимание!**

